


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										PÁGINA: 1 DE 1	
CONTRATO GENERAL: 42300-2024		OBJETIVO Mejoramiento en Pavimento asfáltico de la vía Sampués- San Benito Abad, Municipios de Sampués (K0+500) y San Benito Abad (K0+000) en el Departamento de Sucre										PLAZO REAL: 265 DÍAS FECHA DE INICIO: 2024/04/11 FECHA DE REVISIÓN: 2024/08/20 VALOR REAL (CUMULADO): \$ 116.668.108,20	
CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL SUCRE DE ASISTENCIA		INTERVENIENTOS: CONSORCIO SUCRE										PLAZO ACUMULADO: 265 DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/08/20 VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 116.668.108,20	

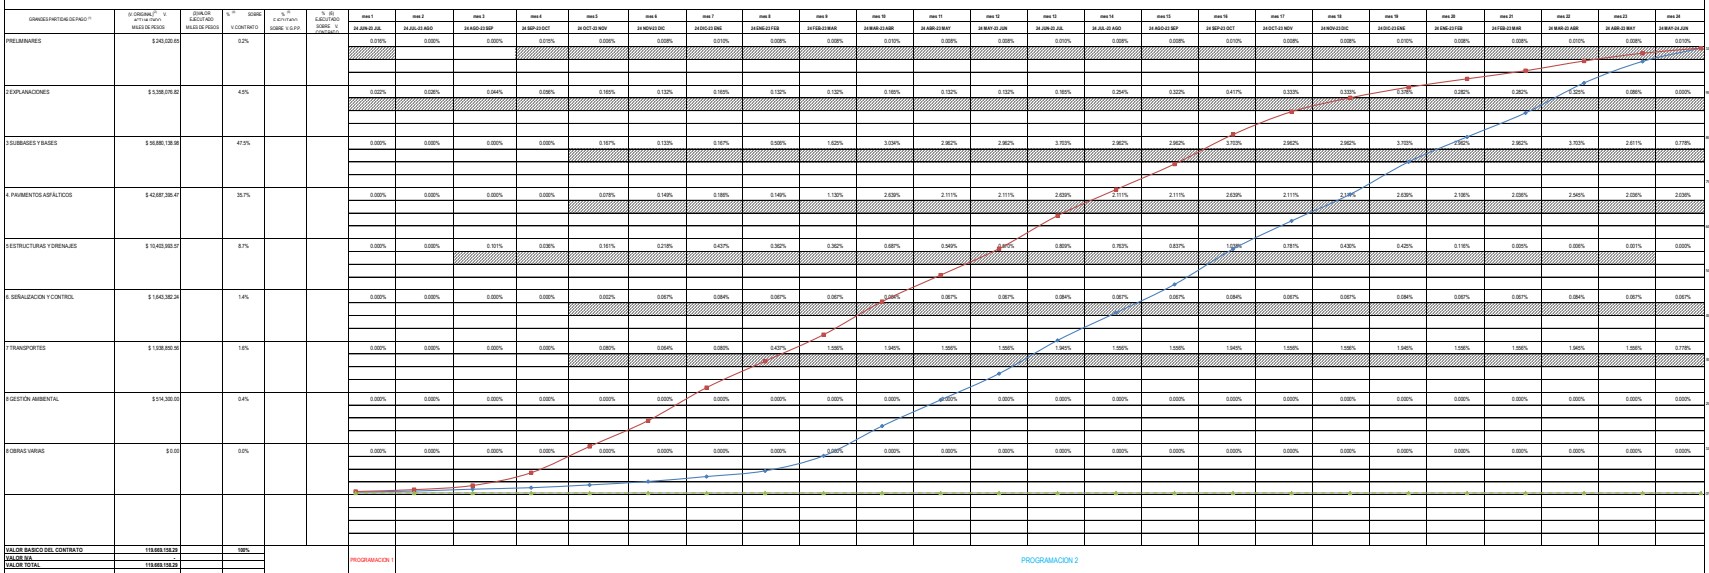

COMERCIONES	INVERSIONES REALIZADAS	MES DE EJECUCION	PROGRAMA		EJECUCION		VALOR	
			%	%	%	%		
BARRAS	100000	0,4%	240000	0,2%	240000	0,2%	240000	0,2%
CURVAS	1000000	0,4%	4000000	0,4%	4000000	0,4%	4000000	0,4%

(*) Deben anotarse los códigos de los items ejecutados
 (1) Valor básico original

Firmas:
 Nombre: **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**
 Representante Legal
 Interventor: **CONSORCIO SUCRE**
 Matricula No.:

Nombre: **JUAN JOSE MERLANO**
 Secretario de Infraestructura
 GOBERNACION DE SUCRE
